Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		Adecuación convenios socios	6 mss	lun 24/07/17	vie 05/01/18	
2		Realización Proyectos	8 mss	lun 08/01/18	vie 17/08/18	1
3		Tramitaciones oficiales	18 mss	lun 25/06/18	vie 08/11/19	2CC+6 mss
4		Desvio colectores	8 mss	lun 07/01/19	vie 16/08/19	3CC+7 mss
5		estación cercanias	14 mss	lun 04/02/19	vie 28/02/20	3CC+8 mss
6		estación largo recorrido	14 mss	lun 11/11/19	vie 04/12/20	5CC+10 mss
7		aparcamiento subterráneo	14 mss	lun 25/05/20	vie 18/06/21	6CC+7 mss
8		Estación autobuses	14 mss	lun 01/03/21	vie 25/03/22	7CC+10 mss
9		edificio pasajeros	14 mss	lun 13/09/21	vie 07/10/22	8CC+7 mss
10		oficinas Adif y Renfe	14 mss	lun 28/03/22	vie 21/04/23	9CC+7 mss
11		cubierta hasta Palacio Justicia	12 mss	lun 02/03/20	vie 29/01/21	6CC+4 mss
12		soterramiento hasta La calzada	12 mss	lun 01/02/21	vie 31/12/21	11
13		urbanización entorno	10 mss	lun 24/04/23	vie 26/01/24	10

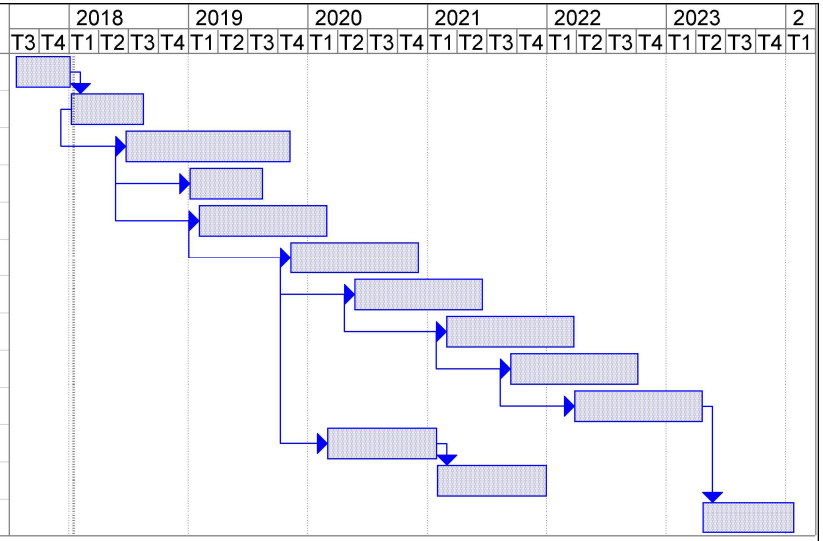

Proyecto: planviasgijonenero18
Fecha: vie 12/01/18

Tarea		Hito		Tareas externas	
División		Resumen		Hito externo	
Progreso		Resumen del proyecto		Fecha límite	
